

Z9/30. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 11.11.2025

17. "MŠ v MČ Brno-Královo Pole, lokalita Dělostřelecká", zařazení investiční akce do závazného plánu investic - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál řeší zařazení investiční akce do závazného plánu investic. Celkové náklady na investici jsou 209 394 tis. Kč. Rada města Brna na svém zasedání č. R9/119 dne 19.02.2025 schválila žádost o zpracování investičního záměru "MŠ v MČ Brno-Královo Pole, lokalita Dělostřelecká". Předmětem investičního záměru je navýšení kapacity v oblasti předškolního vzdělávání v městské části Brno-Královo Pole o 8 - 9 tříd. Novostavba areálu mateřské školy bude umístěna jako stavba dočasná, dle podmínek vycházejících z platného Územního plánu města Brna.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu přesunu finančních prostředků ve výši 1 800 tis. Kč na projektovou dokumentaci z rozpočtu Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna do rozpočtu Odboru investičního Magistrátu města Brna.

Stanoviska

Materiál byl projednán v Radě města Brna dne 5. 11. 2025.

Materiál byl projednán ve Finančním výboru ZMB dne 5.11.2025.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

PhDr. Petr Hruška MBA, vz. PhDr. Irena Čechová

vedoucí odboru - Odbor školství a mládeže

3.11.2025 v 11:21

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

3.11.2025 v 14:21

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha (IZ MŠ v MČ Brno-Královo Pole lokalita Dělostřelecká.pdf)	5 - 19
Příloha k usnesení (RO-MS v MC Brno-Kralovo Pole, Delostrelecka.pdf)	20 - 20

Důvodová zpráva

Odbor školství a mládeže MMB předkládá Zastupitelstvu města Brna materiál zabývající se zařazením investičního záměru na akci „MŠ v MČ Brno-Královo Pole, lokalita Dělostřelecká“ do závazného plánu investic kapitálových výdajů města Brna.

V této lokalitě je již realizována a současně ještě plánována rozsáhlá bytová výstavba, m. j. Rezidenční park Štefánikova, Komplex Ponava, Ponava City IX a Komplex Augarten. Ve více než 1 000 nových bytech se předpokládá nárůst počtu obyvatel o téměř tři tisíce. Pro potřeby předškolního vzdělávání je v této lokalitě navrhována výstavba kontejnerové mateřské školy s osmi nebo devíti třídami.

Rada města Brna na své R9/143. schůzi dne 17.09.2025 schválila investiční záměr a zařadila jej do operativního plánu.

Součástí materiálu je rozpočtové opatření, kterým budou finanční prostředky na pořízení projektové dokumentace ve výši 1 800 tis. Kč převedeny z rozpočtu OŠML MMB § 3119, pol. 6121, ORG 2239 – Projektová příprava MŠ a ZŠ do rozpočtu OI MMB § 3111, pol. 6121, ORG 1693 na akci „MŠ v MČ Brno-Královo Pole, lokalita Dělostřelecká“.

Materiál nebyl z časových důvodů projednán v Komisi investiční Rady města Brna a Komisi výchovy a vzdělávání Rady města Brna.

Materiál byl projednán v Radě města Brna dne 5. 11. 2025.

Materiál byl projednán ve Finančním výboru dne 5.11.2025.

Záměr: „MŠ v MČ Brno-Královo Pole, lokalita Dělostřelecká“

INVESTIČNÍ ZÁMĚR (IZ)

MŠ V MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, LOKALITA DĚLOSTŘELECKÁ

Vypracoval:

OI MMB, Oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly
Ing. Simona Cahová, únor 2025

Souhlasím s návrhem řešení dle IZ
PhDr. Petr Hruška MBA, vedoucí OŠML MMB

... ..

MŠ v MČ Brno-Královo Pole, lokalita Dělostřelecká

1. Základní údaje

Název	MŠ v MČ Brno-Královo Pole, lokalita Dělostřelecká
Žadatel	Odbor školství a mládeže (OŠML)
E-mail žadatele	
Místo investice	Brno-Královo Pole
Věcné zařídění investice	Odbor školství a mládeže (OŠML)
Útvar zpracování IZ	Odbor investiční (OI)
Útvar zajišťující realizaci	Odbor investiční (OI)
Referent IZ	Cahová Simona (MMB_OI)
Popis	Souhlas se zpracováním investičního záměru "MŠ v MČ Brno-Královo Pole, lokalita Dělostřelecká" odsouhlasila Rada města Brna R9/119 na schůzi, konané dne 19.2.2025. Záměrem je navýšení kapacity v oblasti předškolního vzdělávání v městské části Brno-Královo Pole na 8-9 tříd. Předpokládá se vybudování objektu pro maximální kapacitu 225 dětí. Novostavba areálu mateřské školy bude umístěna jako stavba dočasná, dle splnění podmínek vycházejících z platného Územního plánu města Brna, při ulici Dělostřelecká v městské části Královo Pole. Z důvodů charakteru stavby jako stavby dočasné navrhujeme použít kontejnerovou stavbu s variabilitou umístění kontejnerů vedle sebe i nad sebou v nejvyšší možné míře demontovatelnosti, tzn. využití např. modulových objektů (kontejnerů) Celková minimální plocha, uvažovaná pro areál MŠ, je 4864 m². Součástí investičního záměru bude: - výstavba modulární 8-9 třídní mateřské školy s kuchyní a kompletním zázemím - demolice stávajícího objektu - osvětlení a oplocení areálu školy - zahrada s herními prvky Budova mateřské školy bude navržena jako modulární stavba, sestavená z prefabrikovaných kontejnerových modulů, které umožňují rychlou výstavbu a flexibilní dispoziční řešení. Konstrukce bude navržena tak, aby splňovala veškeré hygienické, bezpečnostní a energetické požadavky pro provoz předškolního zařízení. Parkovacích stání bude zajištěno v rozsahu dle příslušné ČSN. Parkování automobilů se předpokládá na přilehlých parkovacích plochách, popřípadě na ploše tomu vyznačené.

Zdůvodnění

Projektové práce budou součástí investičního záměru.

V souvislosti s přípravou a realizací developerských projektů v oblasti bydlení v městské části Brno-Královo Pole schválila Rada města Brna záměr vybudovat devítitřídní mateřskou školu při ulici Střední. Tato plocha je v současné době využívána sportovním tenisovým klubem, který má na pozemku zázemí a sportoviště. Z důvodů složitosti majetkoprávního řešení byl projekt této mateřské školy pozastaven. S ohledem na závazky SMB, které vyplývají ze smluv o spolupráci Města s developery bylo nutné nalézt pro přechodnou dobu místo pro realizaci dočasné stavby mateřské školy. Pozemek při ulici Dělostřelecká je v Územním plánu veden jako rezerva pro dopravní smyčku. V dohledné době se s využitím pozemku pro dopravu nepočítá. Městská část Brno – Královo Pole na svém zasedání Rady městské části odsouhlasilo variantu dočasné stavby 8–9 ti třídní MŠ s použitím kontejnerových modulů. Po

dokončení realizace devítitřídní mateřské školy při ulici Staňkova, bude provoz školy přestěhován, kontejnery budou rozebrány a pozemek bude i nadále sloužit jako rezerva pro dopravu.

Budoucí provozovatel

Odbor školství a mládeže (OŠML);

E-mail budoucího provozovatele

Koordinace s ostatními záměry

Stavbu bude nutné koordinovat s developerskými projekty v území, zejména se stavbou: Rezidenční park Štefánikova, KOMPLEX AUGARTEN

2. Finanční parametry

2.1. Přípravná fáze

	Náklady bez DPH	DPH	Náklady včetně DPH
Majetkoprávní vypořádání	0 Kč	21 %	0 Kč
Projektová příprava	6 000 000 Kč	21 %	7 260 000 Kč
Příprava celkem	6 000 000 Kč		7 260 000 Kč

2.2. Realizační fáze

Stavební náklady	153 450 000 Kč	21 %	185 675 000 Kč
TSB a.s.	200 000 Kč	0 %	200 000 Kč
DBPM a.s.	0 Kč	0 %	0 Kč
BVK a.s.	0 Kč	0 %	0 Kč
Nestavební náklady	0 Kč	21 %	0 Kč
Rezerva	7 682 500 Kč	21 %	9 296 000 Kč
Inženýring	5 454 575 Kč	21 %	6 600 000 Kč
Autorský dozor	300 000 Kč	21 %	363 000 Kč
Realizace celkem	167 087 075 Kč		202 134 000 Kč

2.3. Přípravná a realizační fáze

Příprava a realizace celkem	173 087 075 Kč		209 394 000 Kč
------------------------------------	-----------------------	--	-----------------------

2.4. Provozní fáze

Provozní náklady

Provozní náklady zahrnují předpokládanou částku na úhradu vodného, stočného, plynu a elektrické energie celkového objemu objektu vč. nákladů na mzdy zaměstnanců.

Komunikace a chodník bude vyžadovat běžnou údržbu: zimní údržba, čištění, správa, údržba zeleně, odvodnění atd.

Provozní náklady VO jsou stanoveny na základě „smlouvy na správu a údržbu veřejného osvětlení“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno a.s., a činí 9,23 Kč/jedno světelné místo/ode dne po uplynutí 5-ti leté záruky. V době záruky jsou provozní náklady VO samozřejmě nižší.

Neinvestiční náklady v podobě biologické rekultivace (modelace terénu, zatravnění, výsadba drobné zeleně) v odhadovaných nákladech 1.000.000 Kč budou jednorázové provozní náklady, které nevstupují do ceny investice.

Provozní náklady lze vyčíslit Ano

	Náklady bez DPH	DPH	Náklady včetně DPH
Roční provozní náklady	10 000 000 Kč	21 %	12 100 000 Kč
Nároky na pracovní místa	Ne		

2.5. Příjmy

Příjmy	Investice generuje příjmy ve formě školného, které hradí rodiče za děti navštěvující předškolní zařízení (neplatí pro děti v posledním roce docházky do MŠ). Úhrada za předškolní vzdělání vyplývá z §123 zákona 561/2004 Sb., prováděcím předpisem je vyhláška 14/2005 SB., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V městě Brně se částka na úhradu školného včetně stravného pohybuje mezi 900-1100 Kč/dítě/měsíc
Příjmy lze vyčíslit	Ano
Celkové příjmy	2 700 000 Kč

2.6. Finanční zdroje

Způsob zajištění finančních zdrojů	Investice bude financována z rozpočtu SMB. V současné době do rozpočtu zařazena není. Náklady spojené s vybudováním VO ve výši 200.000 Kč budou společnosti TSB, a.s. uhrazeny formou investiční dotace z rozpočtu SMB.
Podrobný finanční rozpis v příloze	Ne
Etapizace, varianty jsou v příloze	Ne
Sazba DPH podle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění - § 47.	

3. Termíny

Předpoklad zahájení investice	01.07.2025
Přípravné a projektové práce (měsíce)	10
Délka realizace stavby (měsíce)	7
Poznámka	

4. Rizika a jejich kategorie

Riziko - majetkoprávní vztahy	Není identifikováno
Riziko - techn. a dopr. infrastruktura	Není identifikováno
Riziko - ÚPmB	Není identifikováno
Riziko - hydrolog. a geotechn.	Není identifikováno
Riziko - vlivy projektu na ŽP	Není identifikováno
Riziko - koordinace v území	Není identifikováno
Jiné	

5. Umístění (vazba na GIS)

Městská část	Brno-Královo Pole
Katastrální území	Ponava
Ulice	
Seznam parcel	Ponava 604/39, Ponava 601/16, Ponava 604/1, Ponava 601/18, Ponava 577/14, Ponava 603/35, Ponava 601/15, Ponava .602
Nároky na zábor pozemků	Realizace investice si vyžádá dočasný zábor pozemků v ploše vlastního objektu, nových vozovek a chodníků; rozsah bude upřesněn v dalším stupni PD. Nároky na dočasný zábor vzniknou pouze krátkodobě, a to v průběhu realizace investice. Rozsah dočasného záboru bude upřesněn v projektu organizace

Návrh vypořádání MJP vztahů

výstavby (součást DSP).
Není třeba vynětí ze ZPF.

Investice bude realizována na pozemcích ve vlastnictví SMB. Před zahájením přípravy investice budou pozemky prověřeny z hlediska možných restitučních nároků.

Městská část Brno-Královo Pole se stala správcem nemovitosti pozemku p.č. 602.

6. Technické řešení

Technické řešení

Při navrhování ploch budou dodrženy obecné ukazatele návrhových ploch pro plochy místností a pozemků, stanovené odborem školství MMB. Rozsah investice bude odpovídat základním potřebám předškolního zřízení typu MŠ. Modulární mateřská škola bude navržena jako efektivní a udržitelná stavba, která splňuje požadavky na bezpečnost, hygienu, energetickou úspornost a komfort dětí i personálu. Tento návrh kombinuje rychlou a efektivní výstavbu s důrazem na komfort dětí, bezpečnost a ekologickou udržitelnost.

Rozsah investice:

- maximálně dvoupodlažní objekt 8-9 třídni mateřské školy s kapacitou max. 225 dětí dle příslušných stavebních, školských a hygienických norem. Součástí bude školní kuchyně s provozním zázemím, dále prostory pro vedení školy, pedagogický i nepedagogický personál.
- zahrada pro venkovní pobyt dětí (plocha min. 10 m²/dítě), která bude zahrnovat herní prvky a zastínění
- parkovací stání v rozsahu dle příslušné ČSN. Parkování automobilů se předpokládá na přilehlých parkovacích plochách popřípadě na ploše tomu vyznačené.
- osvětlení - předpokládá se osvětlení 2 ks lampami před budovou.
- oplocení areálu zahrady
- přípojky inženýrských sítí:
 - dešťové vody, které nebudou využity k zálivce pozemku ani vsakovány, budou napojeny novou přípojkou na stávající veřejnou dešťovou kanalizaci
 - splašky budou odváděny samostatnou přípojkou do stávající veřejné splaškové kanalizace
 - vodovodní přípojka bude napojena ze stávajícího řádu

Před zahájením realizace je nutné provést dendrologický průzkum stávajících dřevin.

Bude posouzen návrh využití soustavy zásobování tepelnou energií v souladu s Územní energetickou koncepcí statutárního města Brna.

Nároky na energie

Hrubý odhad kapacitních nároků na energie (voda, plyn elektrická energie) lze provést v dalším stupni projektové dokumentace.

Opatření na ochranu ŽP a úsporu energií

Stavba bude navržena v souladu s platnou legislativou (zákon 458/2000 Sb., energetický zákon) jako stavba s téměř nulovou potřebou energie. Konkrétní opatření ke snížení energetické náročnosti stavby budou navržena a vyhodnocena v průběhu zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Na objektu bude zelená střecha. Dešťové vody budou svedeny do akumulární nádrže a využity k zálivce pozemku zahrady. Bude posouzena také možnost jejich vsakování na pozemku. Přebytek napojen do dešťové kanalizace.

7. Legislativa

Legislativa

Záměr lze umístit v souladu s platným územním plánem.

Investice bude realizována na základě povolení Stavebním úřadem.

V průběhu povolovacího procesu bude zpracována odpovídající dokumentace

pro povolení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, v souladu s aktuálně platnou legislativou, vše na podkladu IZ.

V dalším stupni projektové dokumentace je nutné dodržet:

- Požadavky Brněnských stavebních předpisů platných od 1.7.2024
- Principy tvorby veřejných prostranství zpracované Kanceláří architekta města Brna z roku 2019
- Principy Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu, zpracované městem Brnem v roce 2019
- Principy Územní energetické koncepce statutárního města Brna z roku 2018
- Podmínky Poradního sboru pro bezbariérové Brno:

- projekty musí odpovídat obecným technickým požadavkům, které vyplývají ze stavebního zákona č. 283/2021 a respektovat normu ČSN 73 4001

Přístupnost a bezbariérové užívání staveb

- projekt bude ve věci bezbariérového užívání staveb konzultován s Poradním sborem RMB pro bezbariérové Brno, kontaktní osoba: Mgr. Eva Rossi (tajemnice), Odbor zdraví MMB, email: rossi.eva@brno.cz, tel.: 542 172 433 (pozn. lze využít i pro konzultace projektových dokumentací již v průběhu přípravy, spolupracující externí konzultant vyhotoví vyjádření)

- Bude prověřena možnost využití prvků „modrozelené“ infrastruktury, což je síť prvků budovaných v harmonii s přírodou. Zahrnuje vodní prvky pro zachytávání dešťové vody či její čištění. Příkladem prvků modro-zelené infrastruktury jsou zelené střechy nebo zelené stěny, které zvyšují energetickou efektivnost staveb, slouží jako přírodní chlazení a podporují zadržování vody. Mimo budovy, např. ve veřejných prostorech a na ulicích jsou to prvky jako prosakovací dlažba, zatravnovací tvárnice, travnaté pásy, průlehy, stromořadí nebo dešťové zahrady.

- Projekty statutárního města Brna by měly respektovat priority a opatření definované ve Strategii #brno2050 (dokument VIZE 2050, schválený ZMB v září 2020, dokument PLÁN 2030, schválený ZMB v březnu 2021):

- hodnota Architektonická tvář města

- o Respektovat a využívat principy stanovené v Manuálu veřejných prostranství

- hodnota Příroda ve městě

- o Zajistit širší využití zeleně a vodních prvků u veřejných i soukromých projektů

- o Realizovat zelené střechy u městských staveb tam, kde je to možné a vhodné

- o Podpořit revitalizaci a výsadbu stromů a liniové zeleně v uličním prostoru

- hodnota Město s efektivní a udržitelnou mobilitou

- o Podporovat bezbariérová řešení u stávající a nově připravované infrastruktury

- o Zlepšit veřejný prostor zastávek a přestupních terminálů

- o Budovat novou infrastrukturu pro pěší a cyklistickou dopravu a důsledně implementovat cykloinfrastrukturu při rekonstrukcích ulic

- o Při budování nových přestupních terminálů zahrnovat všechny druhy dopravy

- hodnota Zdravé životní prostředí

- o Při obnově dopravní infrastruktury, včetně vozového parku MHD, zohledňovat jejich hlukovou zátěž,

- o Při rekonstrukcích ulic nahrazovat stávající osvětlení pouličními lampami, které znečištění minimalizují, a upravit standardy pro budování veřejného osvětlení dalšími investory

- o Zohledňovat potenciál brownfields a rozvojových lokalit města pro realizaci adaptačních a mitigačních opatření jako nedílnou součást jejich dočasného i budoucího trvalého využití, zejména z hlediska jejich potenciálu pro zasakování srážkových vod a ochlazování města.

- o V rámci rekonstrukcí a revitalizací stávajících a návrhů nově připravovaných veřejných prostranství (vč. ulic, ploch pro parkování ad.) zohlednit jejich

potenciál pro adaptaci na změnu klimatu (efektivního využití zeleně a vody pro potřeby ochlazování, stínu a zasakování v rámci zastavěných částí města)

- o V rámci výstavby a rekonstrukce městských bytů a domů zohledňovat možnosti energetických úspor, úspor vody vč. využití šedé vody či obnovitelných zdrojů energie s ohledem na snižování uhlíkové stopy města
- hodnota Město efektivně hospodařící s vodou
- o Realizovat přírodě blízká protipovodňová opatření jako reakce na problematiku přívalových dešťů (např. zvyšování ploch zeleně pro retenci dešťových vod, budování nových malých vodních ploch)
- o Budovat retenční nádrže a jejich napojení na další přírodě blízká protipovodňová opatření
- o Preferovat úpravy vedoucí k eliminaci půdní eroze
- o Preferovat oddílný systém kanalizace v nové výstavbě
- o Realizovat pilotní projekty veřejné sféry (nad rámec zákona) – zelené střechy, chytré a inovativní projekty na retenci a druhotné využití dešťové vody atd.
- Hodnota Energeticky šetrné, nezávislé a odolné město
- o Podpořit kombinaci centrálního zásobování a decentralizovaných zdrojů pro optimalizaci fungování zásobování energiemi
- o Zavést využívání OZE jako nezbytnou podmínku rekonstrukcí a výstavby nových budov / splnit požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle platné legislativy ČR a EU
- hodnota Sdílená vize a dobré jméno města
- o Zohledňovat při plánování investic do rozvoje města (investičních staveb) důsledně jejich provozní náklady
- o Zavádět nové nástroje, které zmírňují prodlevy v investiční přípravě (např. důsledná koordinace staveb, majetkoprávní příprava se zapojením všech relevantních složek města včetně městských společností a městských částí = ochrana před spekulanty v rozvoji města, spoluvytváření lokalit – sdílená odpovědnost mezi městem a jeho partnery, využívání inovativních informačních a digitálních technologií a nástrojů)
- Při navrhování ploch budou dodrženy obecné ukazatele návrhových ploch pro plochy místností a pozemků, stanovené odborem školství MMB

V předstihu je vhodné prověřit záměr podrobnou architektonicko-dispoziční studií.

Projektové dokumentace budou součástí investice.

8. Schvalování

Stav investičního záměru	Ke schválení
Datum předání IZ odvětv. odboru	18.06.2025

Souhlas s návrhem řešení dle Ano
IZ

Kontrola věcné správnosti	Ano
Stavba dokončena	Ne

8.1. Schvalování v RMB

Schválení IZ	-
Schválení - číslo RMB	
Schválení - datum schválení	
Schválení - poznámka	

8.2. Zařazení do rozpočtu

Schválení zařazení do
rozpočtu

Schválení zařazení do
rozpočtu - číslo RMB

Schválení zařazení do
rozpočtu - datum

Částečné financování Ne

ORG


Přiděleno k realizaci

9. Přílohy


Soupis příloh

1. Grafická část - situace
2. Grafická část - situace širších vztahů
3. Ilustrační foto
4. Report z ÚPmB

MŠ V MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, LOKALITA DĚLOSTŘELECKÁ

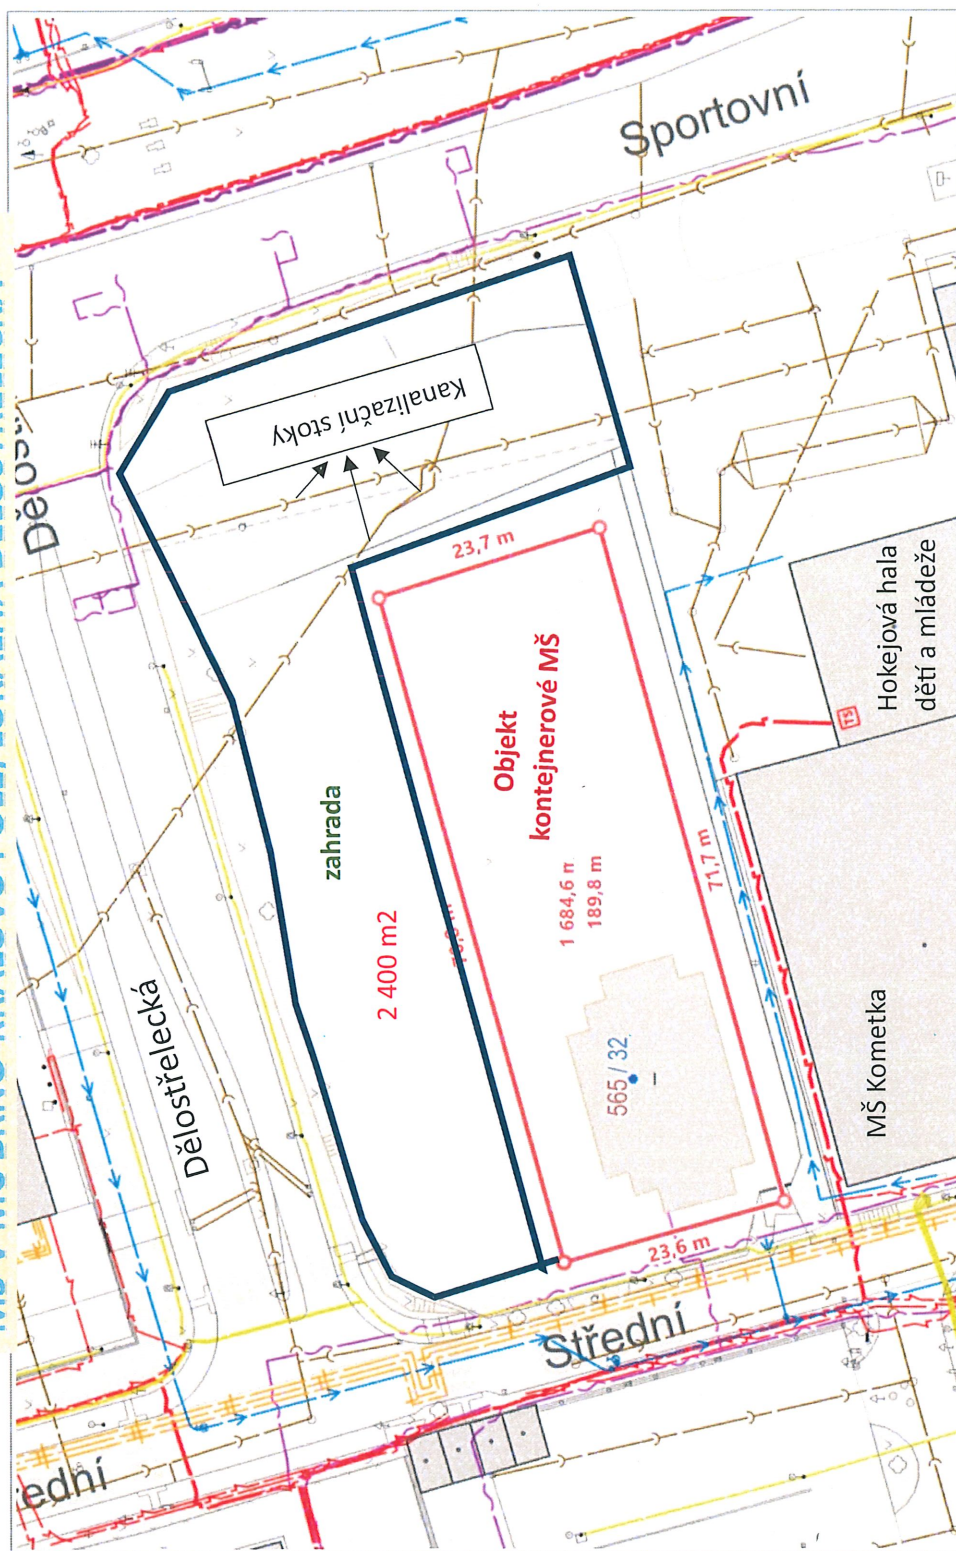

MŠ V MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, LOKALITA DĚLOSTŘECKÁ

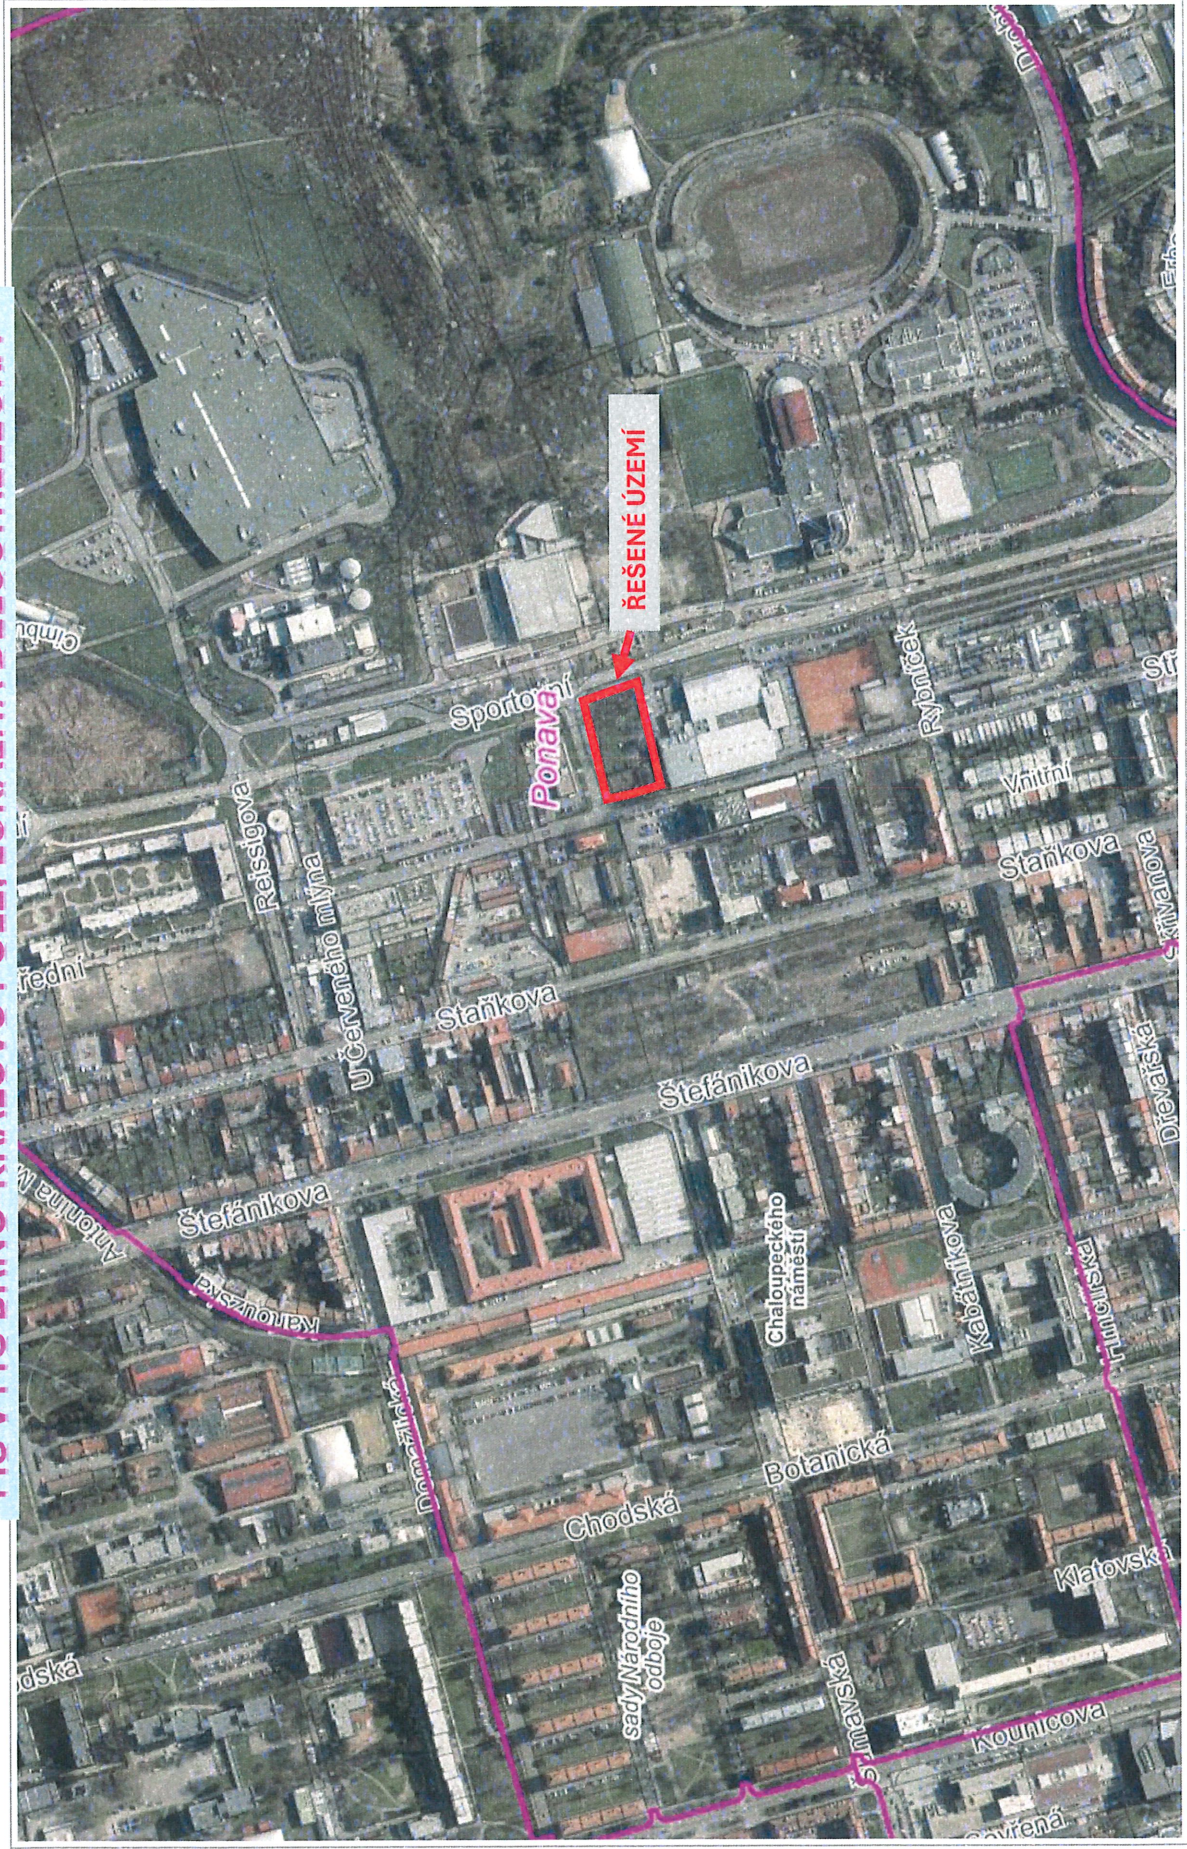



Mateřská škola z modulárních buněk pro 140 dětí



Mateřská škola z modulárních buněk – 4 třídní



Mateřská škola z modulárních buněk – 4 třídní




Mateřská škola z modulárních buněk – 4 třídní



Mateřská škola z modulárních buněk – 4 třídní

Report z ÚPmB k pozemku parc. č. 603/35, k.ú. Ponava

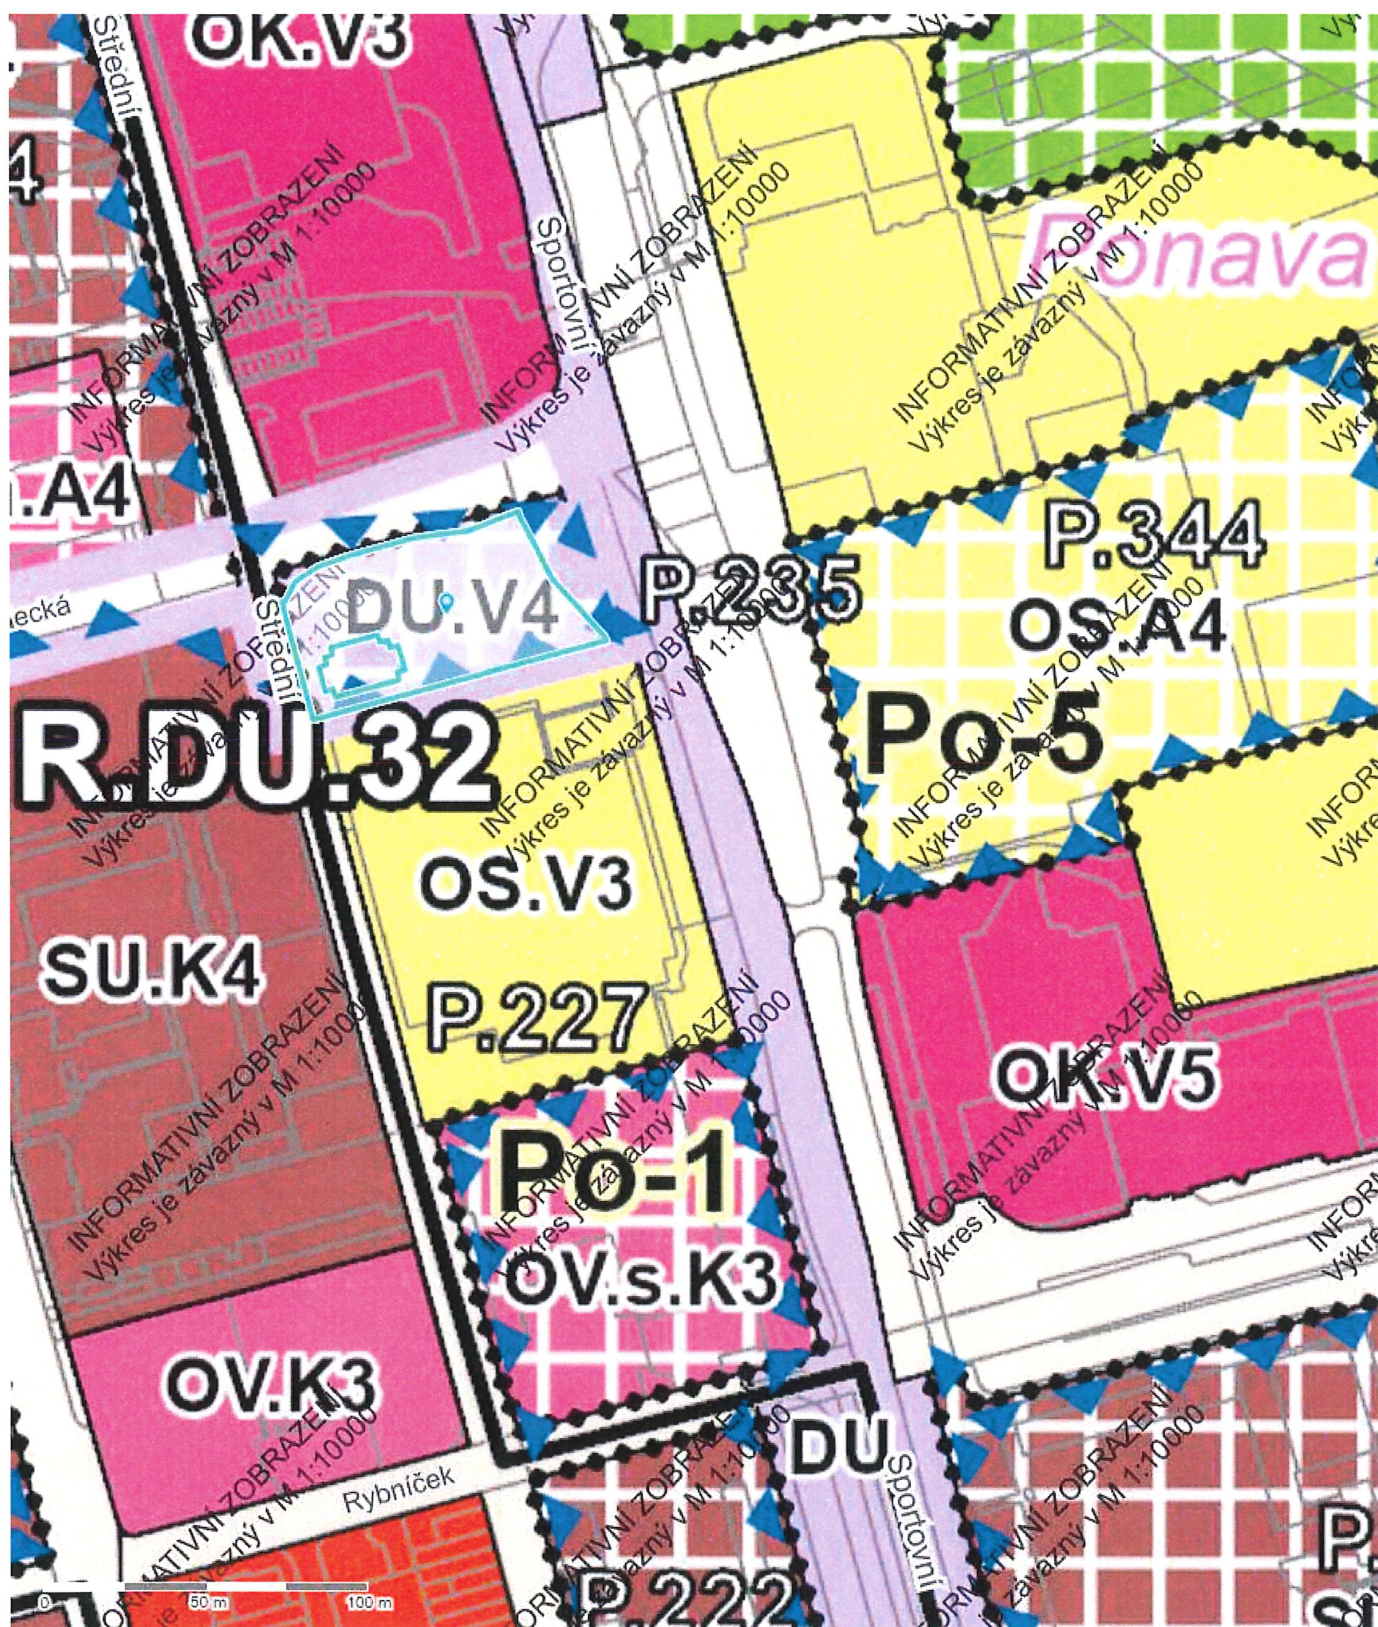

Parcela

Katastrální území	Ponava
Číslo parcely	603/35
List vlastnictví	10001
Druh pozemku	ostatní plocha
Způsob využití	jiná plocha
Výměra dle KN	3 449 m ²
Výměra dle geometrie	3 449 m ²
Stav parcely k	01.03.2025

Informace k dotčené ploše s rozdílným způsobem využití z ÚPmB

Stav	plocha přestavby
Kód plochy s rozdílným způsobem využití (RZV)	DU
Název RZV	Doprava všeobecná
Struktura zástavby	volná
Výšková úroveň zástavby	9-22 m
Podrobnější využití	–
Výměra pozemku dotčená danou plochou RZV	3 449 m ² (100%)

Další informace z ÚPmB

Koridor plošně vymezený	–
Zóna se shodným charakterem	Z6.20 Ponava
Rozvojová lokalita	Po-2 Poděbradova - Staňkova
Územní rezerva	R.DU.32
Koridor nad plochami s rozdílným způsobem využití	–
VPS a VPO s možností vyvlastnění – plošné	–
VPS a VPO s možností vyvlastnění – liniové	–

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 27.10.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5200	3119	6121		2239	Projektová příprava MŠ a ZŠ	6 000	-1 800	4 200
5600	3111	6121		1693	MŠ v MČ Brno-Královo Pole, lokalita Dělostřelecká	0	1 800	1 800
